



Überblick LCCevo & IBN ALPHA Gemeinschaft ehem. Lufthanseaten

10.04.2026

Alexandra Wesser & Viktoria Donat



Lufthansa Cargo

Lufthansa Cargo
Enabling Global Business

3800
Mitarbeiter

350
Stationen

12
Boeing 777F

6
Boeing 777F
von AeroLogic

4
Airbus 321F

480
Passage Bellies

2150
Road Feeder Service Trucks



Lufthansa Cargo Center
Frankfurt

330.000m²

Gesamtfläche, davon 110.000m² Warehouse

900


Mitarbeiter im Handling Frankfurt

80%

des weltweiten Frachtvolumens

900.000t

Frachtumschlag pro Jahr

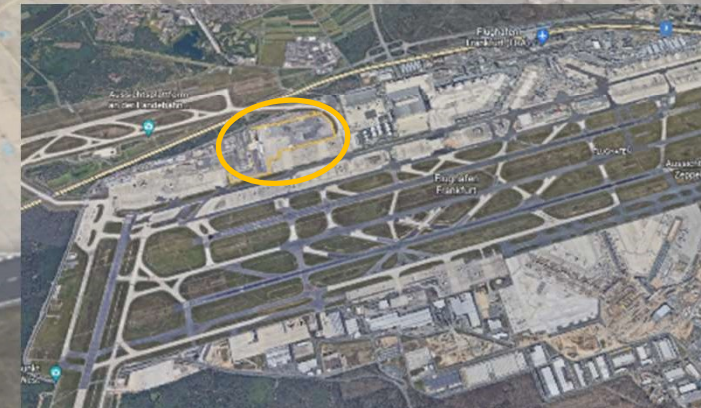

Lufthansa Cargo Center 1982 als modernstes Frachthub eröffnet
Seitdem hat sich viel geändert & weiterentwickelt...oder nicht?



LCCevolution
ALPHA BRAVO CHARLIE



1982



24/7
365 Tage
40+ Jahre

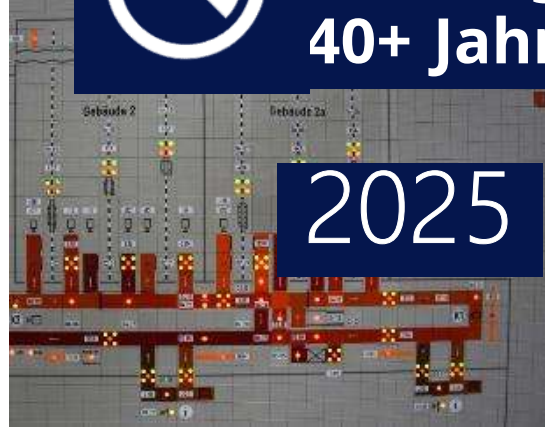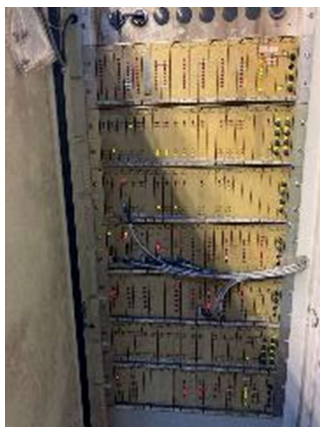

2025



LCCevolution

Umfassende Sanierungs- und Neubaumaßnahmen des LCC

LCCevo¹
ALPHA BRAVO CHARLIE



>40 Jahre
24/7
Betrieb

- behördliche Auflagen
- betriebliche Anforderungen
- modulare Ausbauoptionen

9 Jahre
Projektzeit (2021 bis 2030)


600 m€
Gesamtvolumen

24/7
unterbrechungsfreier Betrieb

LCCevolution | Einführung | Motivation

Modulare Modernisierung der Logistikinfrastuktur

LCCevo¹

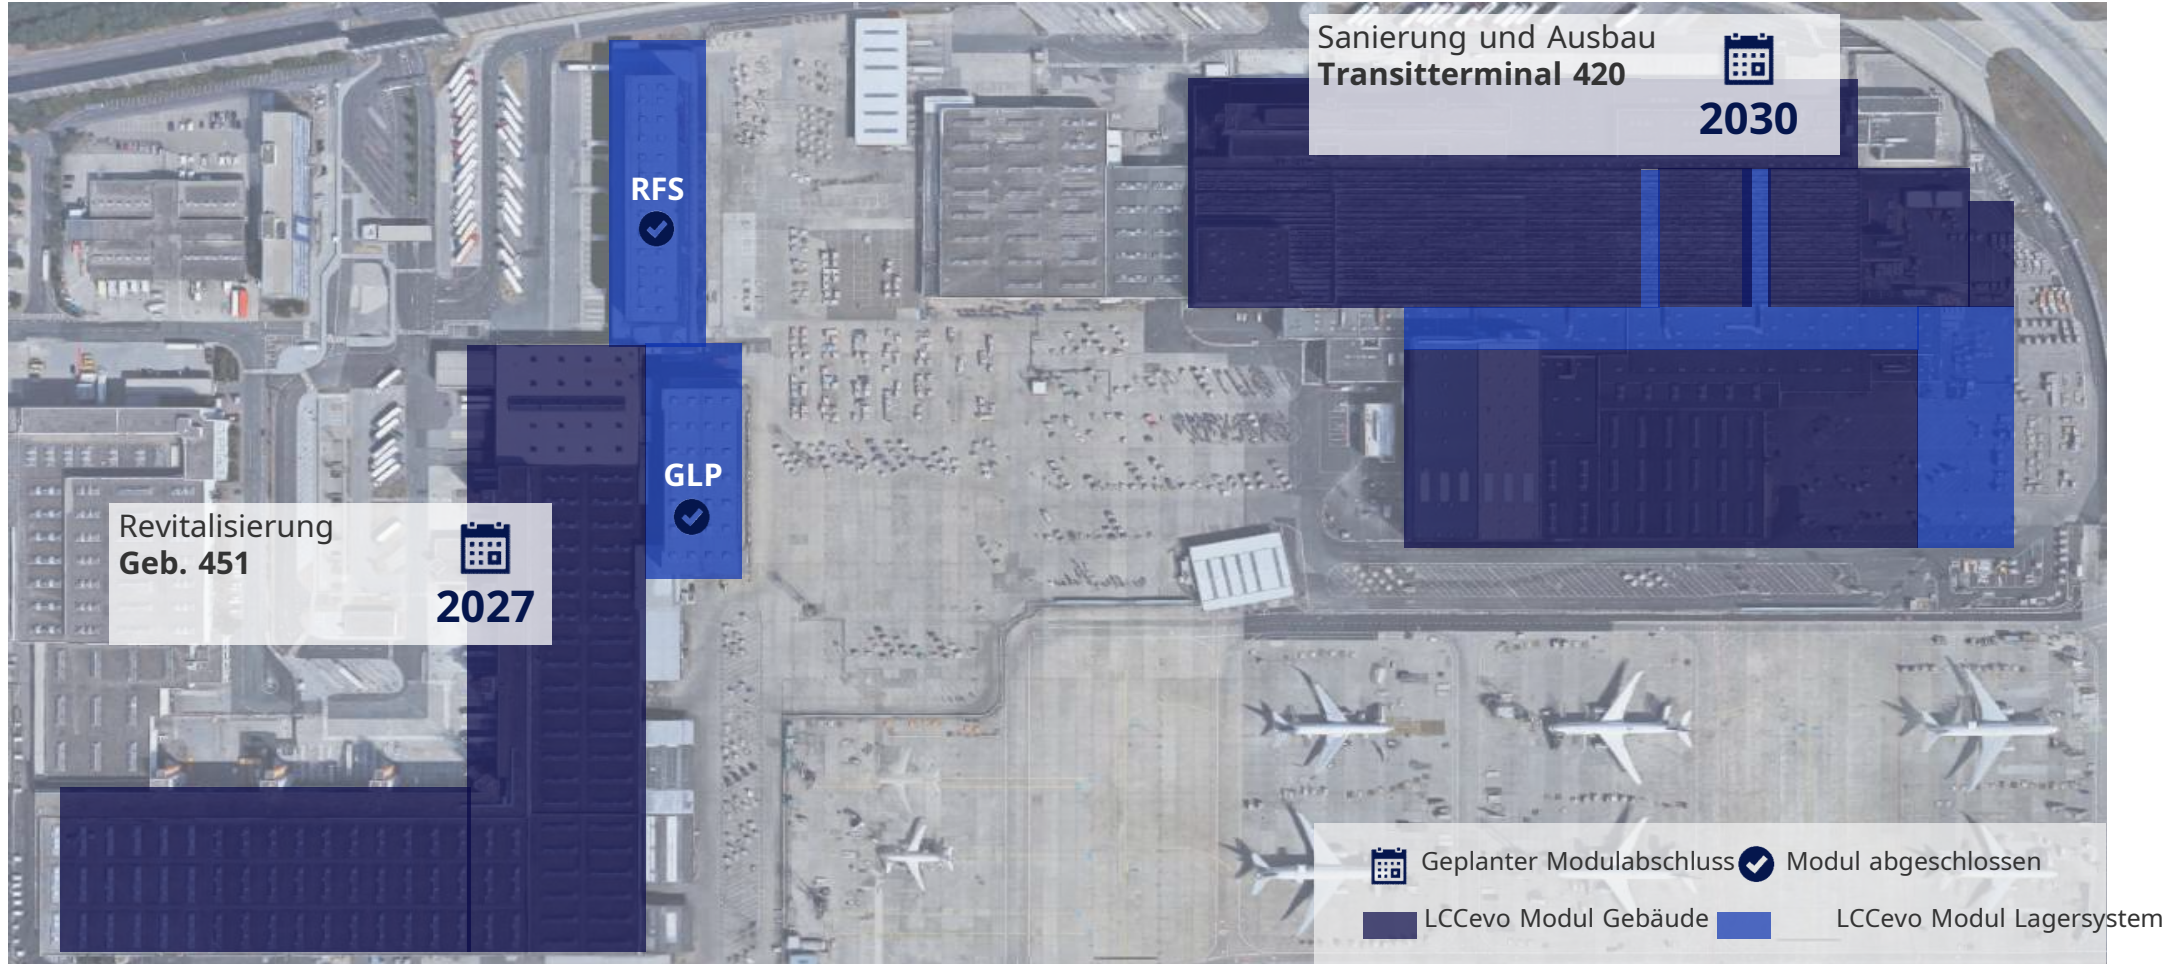



Phase ZERO

Phase ALPHA

Phase BRAVO

Phase CHARLIE


2021

2023

2027

2029

2030/31




- **Baufeldräumung** im Osten, Prozess- und Bürourzüge
- kleinere **Abrissmaßnahmen**
- Herstellen **Ver- und Entsorgungsleitungen**
- **Reduzierung** verfügbarer Außen-flächen um rund 20%



- Bau neuer **Hallenmodule**
- Errichtung **Hochregallagersystem**
- Aufbau einer **interimistischen Fördertechnik**-Anbindung



- **Abriss des südlichen Gebäudeteils** (best. Hochregallager (gestrichelt), Fördertechnik sowie südliche Hallenbereiche, Werkstattgebäude)
- **Neubau Hallenmodul** im Süden sowie Erweiterung der Materialflussachse



- **Kernsanierung** nördliche Gebäude-teile in drei Abschnitten (von Ost nach West)
- **Einbau restliche Fördertechnik** in die sanierten nördlichen Hallenmodule
- **Rückbau** von westl. Gebäude

Legende: Baufeld GLP-Lagersystem und Materialflussachse Hallenmodule

LCCevolution – Phasen ALPHA, BRAVO and CHARLIE



LCCevolution Inbetriebnahmezeitplan - Phase ALPHA 2026/2027



Unsere "ALPHA-Crew"

39 Multiplikatoren aus 12 verschiedenen Bereichen tragen zur erfolgreichen IBN bei



26 Baustellenführungen - 230 Mitarbeiter (LCAG & FACL) nah am Baufortschritt



Explore IBN ALPHA Impressionen aus der ersten Woche





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  **Lufthansa Cargo**
Networking the world.
